


# 敷地境界での臭気強度測定結果

## 臭気強度（臭気測定器による結果を指数化）

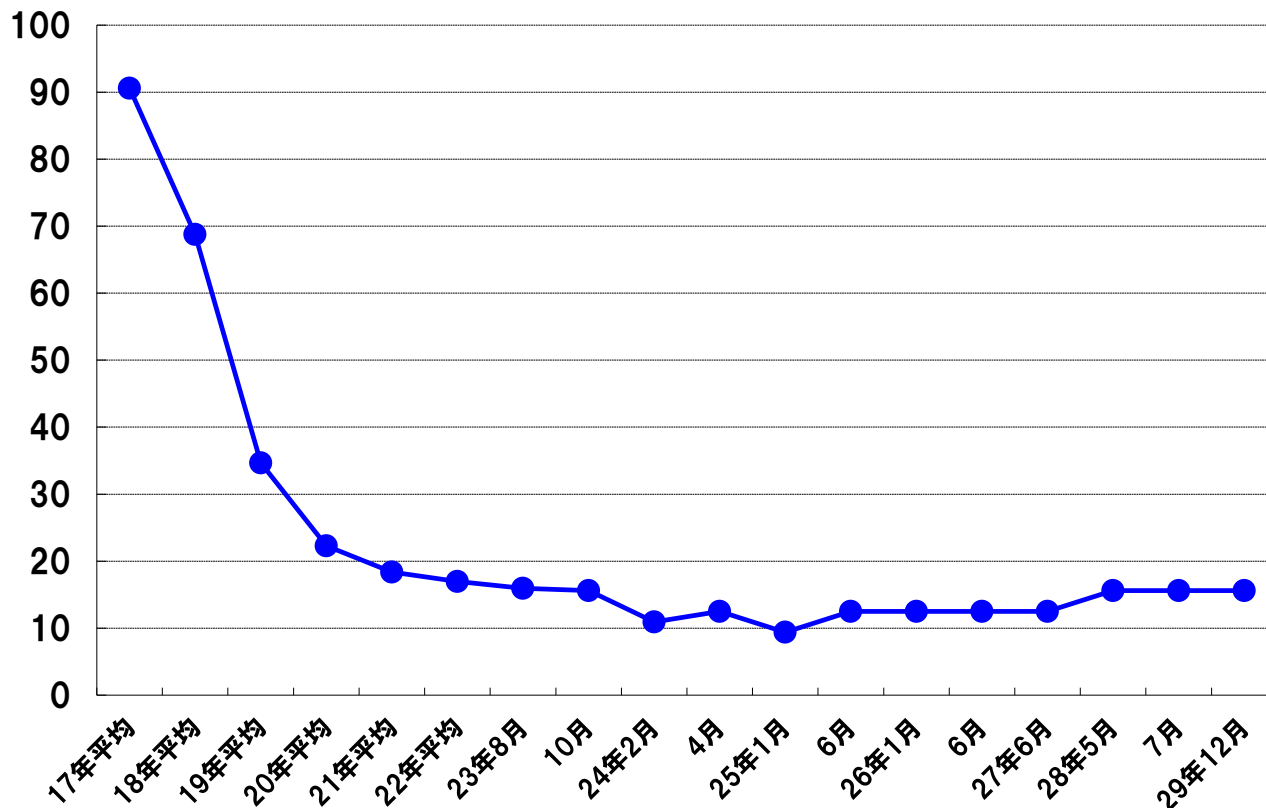

臭気対策実施状況	
対策内容	実施日
1 樹脂・硬化剤改善	H17.3 H18.3 H18.9
	H20.11 H22.8 H23.8
	H24.1
2 自動開閉シートシャッター導入・増設	H18.3
	H19.10
	H22.4
	H22.12
3 消臭装置エコソープ導入・増設	H24.4
	H21.6
	H23.8
	H24.4
4 排気口じん傘タイプへ変更	H23.7
	H23.10
5 冷却ミスト発生装置導入・増設	H24.4
	H25.6
6 ネオコールド導入	H25.6
7 人工砂導入	H25.6
8 再生機能力アップ	H25.6
	H27.4
9 樹脂更新	H26.1
10 添加量スイッチ増設	H26.1
11 ドブ漬けライン導入	H26.6
